

 **HELGELANDSSYKEHUSET**  
HELGELAANTEN SKIËMTJEGÄETIE



**Nye Helgelandssykehuset**

**Overordnet samarbeidsorgan**

**2. september 2021**

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator

Kvalitet

Respekt

Trygghet

# Status i prosjektet

---

- Prosjektorganisering

Prosjektdirektør – søknadsfrist 29. september

Nye prosjektsjef i Sykehusbygg: Lindis Burheim



# Prosesser som ble avsluttet før sommeren

---

- Faglig strategisk utviklingsplan (FSU)
- Oppdatert økonomisk bæreevneanalyse
- Tomteutredning



Styrebehandlet i Helgelandssykehuset 25. juni og i Helse Nord 30. juni

- Rishatten og dagens sykehustomt tas med videre
- Dokumentgjennomgang Tovåsen
- Operasjonalisering (HSYK)/begrepsavklaring hovedsykehus (HN)
- HN skal behandle SFU og øk. bæreevneanalyse på nytt

# Hva skjer nå?

---


- Prosjektet er forsinket i forhold til oppsatt plan – styringsdokument for neste fase behandles først i oktober. Avhengig av beslutninger i Helse Nord.
- Dokumentgjennomgang og ytterligere vurderinger av Tovåsen-alternativet
- Operasjonalisering av hovedsykehus
- Samarbeid med Grane, Hattfjelldal og Vefsn ang. somatisk poliklinisk tilbud i Vefsn – avventer oppstart av konseptfasens steg 1



# Dokumentgjennomgang – plan vedtatt av styret i HSYK


---


Dokumentgjennomgangen og de ytterligere vurderingene vil foregå etter følgende plan:

1. Sammenfatning av alle tidligere utredninger utover det som allerede foreligger i forutsetningsnotatet og tomterapporten.
  2. Dialog og avklaring med Nordland fylkeskommune, berørte kommuner og andre relevante parter for å utdype regionale konsekvenser og tiltak med sykehustomt i Tovåsen. Dette vil for eksempel være områder som samfunnskonsekvenser, samferdsel, kollektivtransport, beredskap, teknisk infrastruktur, natur- og kulturminner, miljø, m.m.
  3. Vurdering av konsekvenser for videre prosess –tid/fremdrift, kvalitet og økonomi.
- 

# Konseptfasens steg 1

---

- Konseptfasen steg 1 starter når styringsdokumentet er vedtatt av styrene
  - Strekker seg fram til høsten 2022
  - Klargjøre premissene for innholdet i byggene i form av et hovedprogram
  - Utvikle og utrede alternative konsepter i form av fysiske løsninger. Vil kreve omfattende medvirkning
  - Sentral aktivitet: sammelikne ulike løsningsalternativer
  - Fasen avsluttes med anbefaling av løsningsalternativ
- 

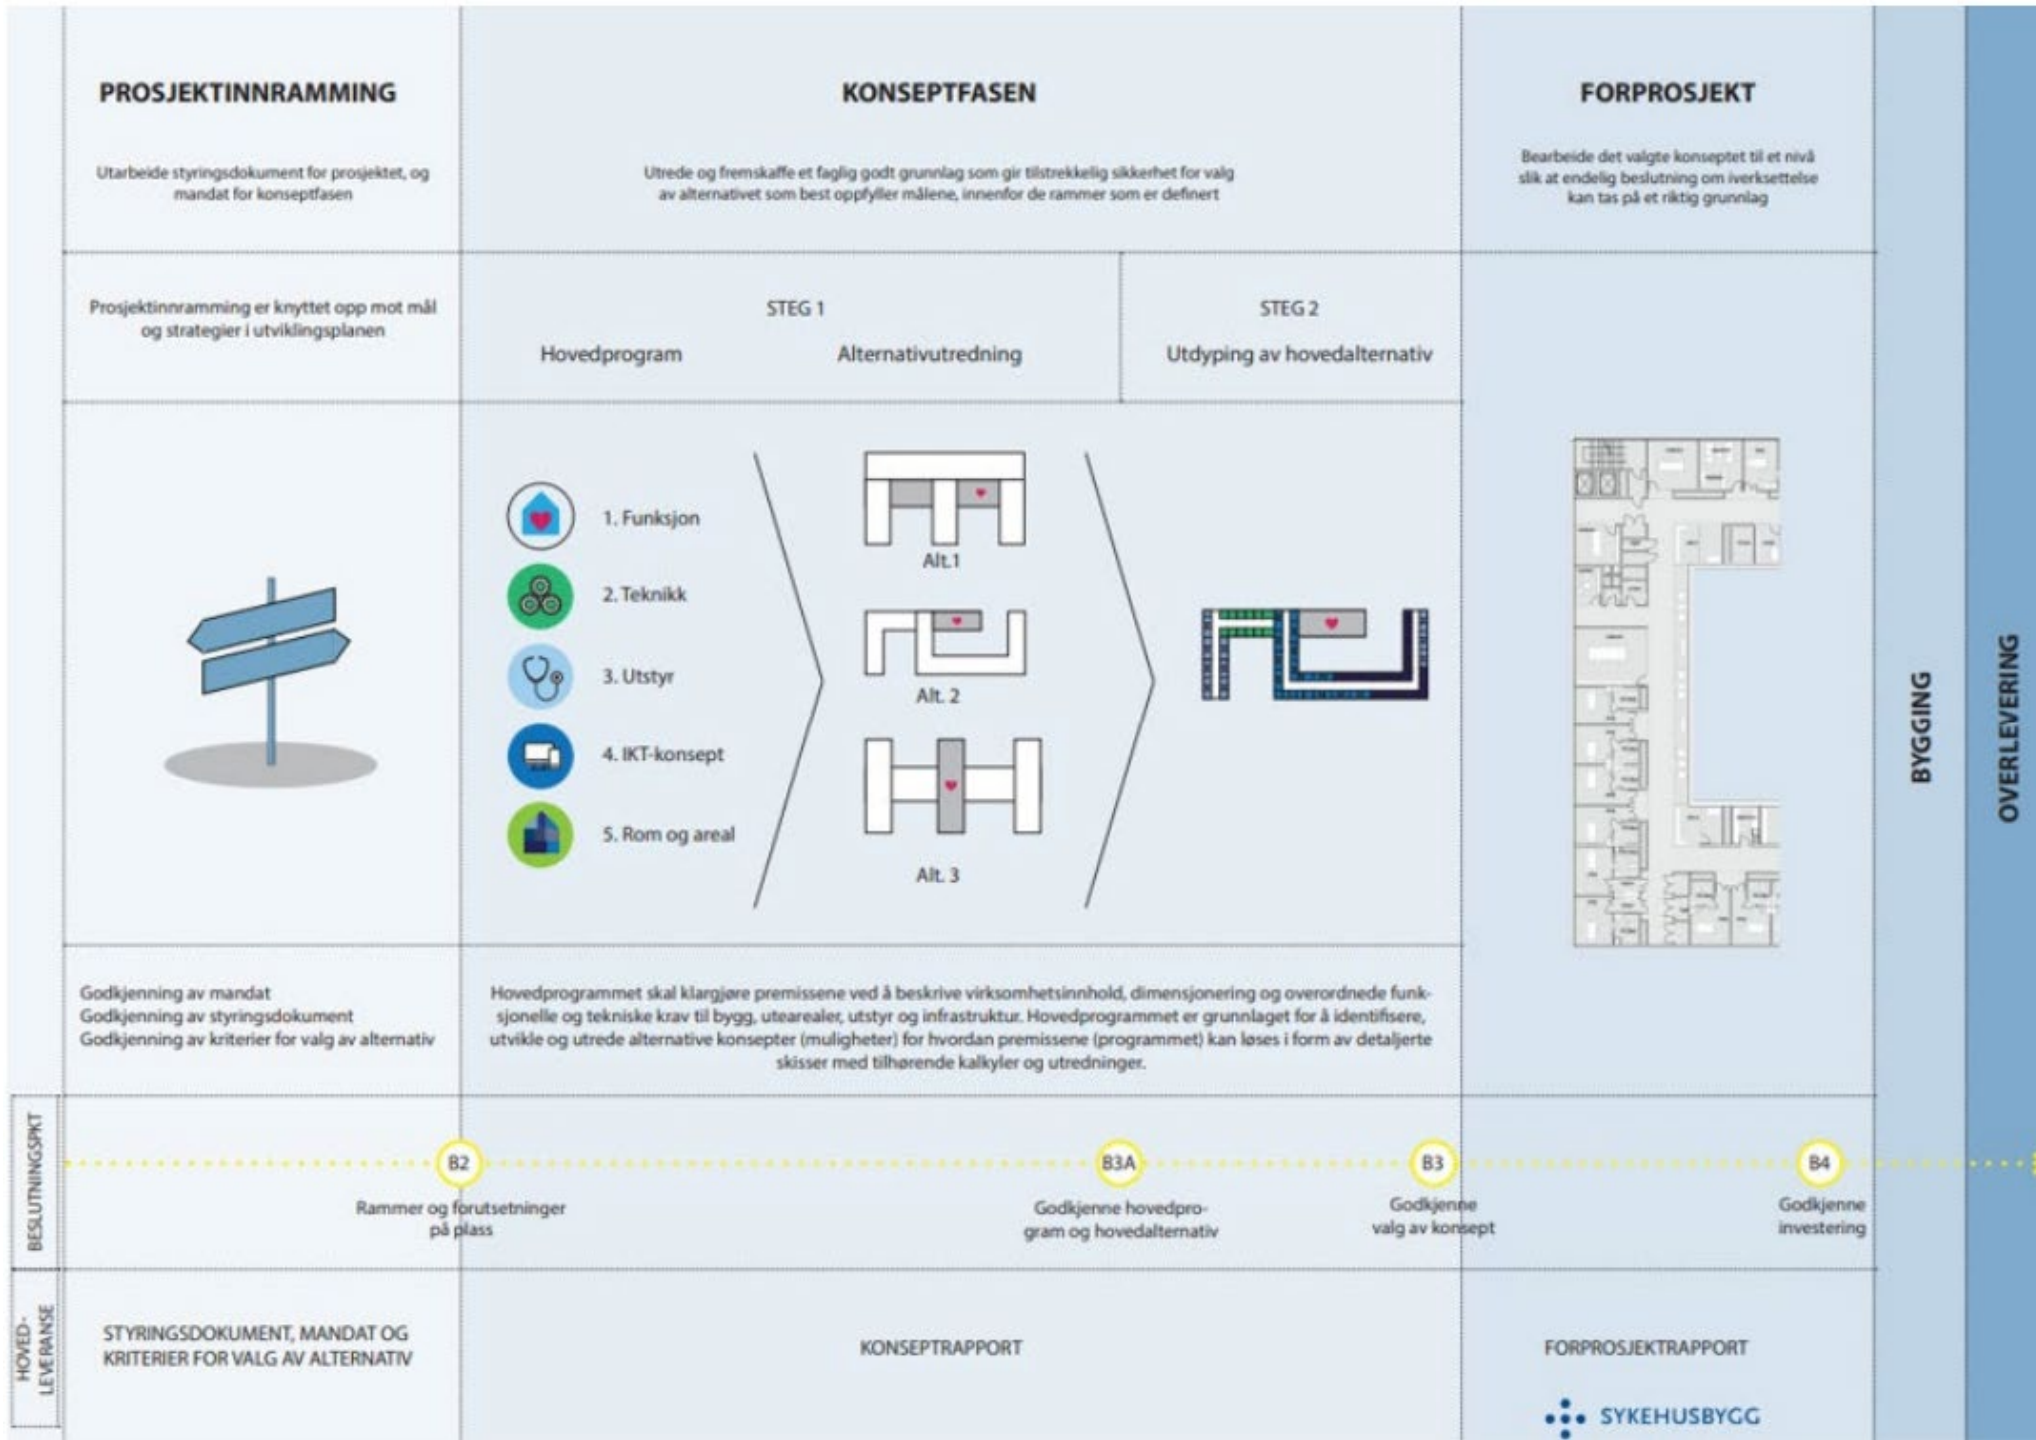

BYGGING

OVERLEVERING
