




















ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2015		2016		2017		2018	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
1	IDÉFASE HELGELANDSSYKEHUSET HF	498 dager	to 29.10.15	fr 15.12.17								
2	INNLEDENDE AKTIVITET	67 dager	to 29.10.15	fr 29.01.16								
3	Mandat	35 dager	to 29.10.15	on 16.12.15								
4	Styrebehandle mandat HS HF	1 dag	to 29.10.15	to 29.10.15								
5	Styrebehandle mandat i styret HN RHF	1 dag	on 16.12.15	on 16.12.15								
6	Ny nasjonal Helse- og sykehusplan	85 dager	fr 20.11.15	to 17.03.16								
7	Forslag	1 dag	fr 20.11.15	fr 20.11.15								
8	Stortingsvedtak	1 dag	to 17.03.16	to 17.03.16								
9	Prosjektplan	10 dager	ma 01.02.16	fr 12.02.16								
10	Styrebehandle prosjektplan HS HF	10 dager	ma 01.02.16	fr 12.02.16								
11	Anskaffelse rådgivere (rammeavtale HSØ)	55 dager	fr 12.02.16	ma 09.05.16								
12	Utarbeidelse av konkurransegrunnlag (3 uker)	15 dager	ma 15.02.16	fr 04.03.16								
13	Tilbudsregning (4 uker)	19 dager	ma 07.03.16	fr 08.04.16								
14	Evaluering og innstilling (3 uker)	15 dager	ma 11.04.16	fr 29.04.16								
15	Kontrahering	5 dager	ma 02.05.16	ma 09.05.16								
16												
17	OVERORDNEDE KRAV OG RETNINGSLINJER TIL LOKALISERING OG TOMT	92 dager	ti 26.01.16	ti 14.06.16								
18	Oppstartsmøte kommune, tillitsvalgte og sykehus	1 dag	ma 08.02.16	ma 08.02.16								
19	Sammenstilling av overordnede krav og retningslinjer til lokalisering og tomt	35 dager	ma 01.02.16	fr 18.03.16								
20	Internt oppstartsmøte SB HF	1 dag	ma 25.01.16	ma 25.01.16								
21	Internt møte SB HF	1 dag	ma 15.02.16	ma 15.02.16								
22	Internt møte SB HF	1 dag	ma 07.03.16	ma 07.03.16								


Prosjekt: 151222 Idéfase Helgel
Dato: fr 05.02.16

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Inaktiv aktivitet		Bare start			
Inaktiv milepæl		Bare slutt			

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2015		2016		2017		2018	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
23	Møte med Fylkeskommune, Helgelandssykehuset	1 dag	ti 15.03.16	ti 15.03.16								
24	Offentlig høring	29 dager	ma 21.03.16	fr 06.05.16								
25	Avklare hvilke kommuner som oppfyller overordnede krav og retningslinjer	9 dager	ti 10.05.16	ti 24.05.16								
26	Oppstartsmøte med rådgivere, oppsummering av høring	1 dag	ti 10.05.16	ti 10.05.16								
27	Arbeidsmøte 1 med Fylkeskommune, Helgelandssykehuset HF, Fylkesmann	1 dag	on 18.05.16	on 18.05.16								
28	Arbeidsmøte 2 med Fylkeskommune, Helgelandssykehuset HF, Fylkesmann. Innstilling	1 dag	ti 24.05.16	ti 24.05.16								
29	Styrebehandle HS RHF	9 dager	to 02.06.16	ti 14.06.16								
30	Styrebehandle HN RHF	10 dager	to 02.06.16	on 15.06.16								
31												
32	PLANPROSESS IHT PBL - UTARBEIDELSE AV PLANPROGRAM OG KU	336 dager	to 16.06.16	to 07.12.17								
33	Planprogram	106 dager	to 16.06.16	to 08.12.16								
34	Invitasjon til Fylkeskommune, Fylkesmann og kommunene om å delta i planprosessen	1 dag	to 16.06.16	to 16.06.16								
35	Oppstart planprogram	1 dag	ma 20.06.16	ma 20.06.16								
36	Planprogram (ca 3 mnd)	59 dager	ma 20.06.16	to 06.10.16								
37	Høring planprogram (min 6 uker)	30 dager	fr 07.10.16	to 17.11.16								
38	Revisjon av planprogram som konsekvens av høring	10 dager	fr 18.11.16	to 01.12.16								
39	Sakspapirer til Fylkesting (10-8 uker før Fylkesting)	1 dag	fr 07.10.16	fr 07.10.16								
40	Fylkesting Nordland Fylkeskommune, orienteringssak	4 dager	ma 05.12.16	to 08.12.16								
41	Styrebehandling HN RHF, planprogram	1 dag	to 08.12.16	to 08.12.16								
42	Konsekvensutredning (KU1 regionale tema)	126 dager	ma 12.12.16	ma 19.06.17								
43	Oppstartsmøte KU1 (regional)	3 dager	ma 12.12.16	on 14.12.16								
44	Utarbeidelse av regional KU(3 mnd)	66 dager	ma 12.12.16	ti 14.03.17								

Prosjekt: 151222 Idéfase Helgel Dato: fr 05.02.16	Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
	Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
	Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
	Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
	Inaktiv aktivitet		Bare start			
Inaktiv milepæl		Bare slutt				

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2015		2016		2017		2018	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
45	Høring regional KU (6 uker)	30 dager	on 15.03.17	to 04.05.17								
46	Sakspapirer til Fylkesting (10 uker før Fylkesting)	50 dager	on 15.03.17	fr 02.06.17								
47	Fylkesting Nordland Fylkeskommune, høring (møtetid ikke satt)	1 dag	ma 05.06.17	ma 05.06.17								
48	Styrebehandling HN RHF, lokalisering	10 dager	ti 06.06.17	ma 19.06.17								
49	Konsekvensutredning (KU2 kommunale tema)	113 dager	ti 06.06.17	to 07.12.17								
50	Oppstartsmøte KU2 (Kommunal)	3 dager	ti 20.06.17	to 22.06.17								
51	Utarbeidelse av kommunal KU	45 dager	ti 06.06.17	ma 04.09.17								
52	Høring plan og kommunal KU (min 6 uker)	30 dager	ti 05.09.17	ma 16.10.17								
53	Innarbeidelse av kommentarer etter høring	10 dager	ti 17.10.17	ma 30.10.17								
54	Eventuelt sluttvedtak kommune	10 dager	fr 24.11.17	to 07.12.17								
55												
56	GJENNOMFØRING AV IDÉFASEN	431 dager	ma 01.02.16	fr 15.12.17								
57	Oppdatering utviklingsplan, utvidet alternativsøk	89 dager	ma 01.02.16	on 15.06.16								
58	Oppstart	1 dag	ma 01.02.16	ma 01.02.16								
59	Oppdatering av utviklingsplanen	59 dager	ma 01.02.16	fr 29.04.16								
60	Prosjektavgresning, utvidet alternativsøk	56 dager	ti 01.03.16	ma 30.05.16								
61	Styrebehandle hvilke alternativer som skal utredes videre i idéfasen HS HF	10 dager	on 01.06.16	ti 14.06.16								
62	Styrebehandle hvilke alternativer som skal utredes videre i idéfasen HN RHF	10 dager	to 02.06.16	on 15.06.16								
63	Videre vurdering av alternativer som er valgt for idéfasen	131 dager	ma 02.01.17	fr 11.08.17								
64	0-alternativet											
65	Input fra regional og kommunal KU (før høring kommunal KU)	1 dag	fr 23.06.17	fr 23.06.17								
66	Plan for gjennomføring av konseptfasen	1 dag	fr 07.07.17	fr 07.07.17								

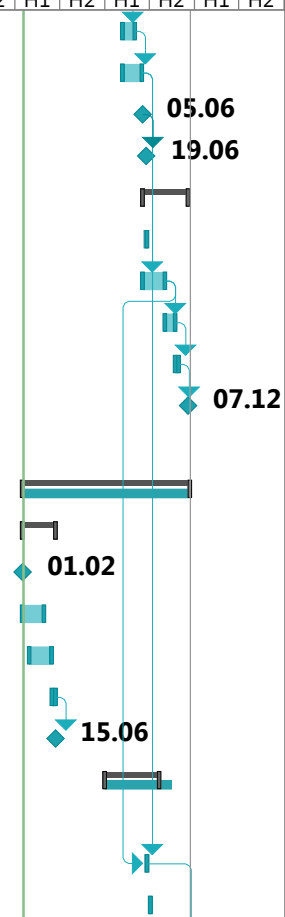

Prosjekt: 151222 Idéfase Helgel Dato: fr 05.02.16	Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
	Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
	Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
	Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
	Inaktiv aktivitet		Bare start			
Inaktiv milepæl		Bare slutt				

ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	2015		2016		2017		2018	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
67	Idéfaseutredning og rapport	165 dager	ma 02.01.17	to 28.09.17								
68	Behandling/godkjenning	56 dager	fr 29.09.17	fr 15.12.17								
69	Høring Idéfaserapport	30 dager	fr 29.09.17	to 09.11.17								
70	KSI (3. partskontroll av idéfasen)	30 dager	fr 29.09.17	to 09.11.17								
71	Behandle kommentarer fra høring idéfaserapport og KSI	10 dager	fr 10.11.17	to 23.11.17								
72	Styrebehandling HS HF	10 dager	fr 24.11.17	to 07.12.17								
73	Styrebehandling HN RHF	10 dager	ma 04.12.17	fr 15.12.17								

Prosjekt: 151222 Idéfase Helgel
Dato: fr 05.02.16

Aktivitet		Inaktivt sammendrag		Eksterne aktiviteter	
Deling		Manuell aktivitet		Ekstern milepæl	
Milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Sammendrag		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Prosjektsammendrag		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Inaktiv aktivitet		Bare start			
Inaktiv milepæl		Bare slutt			
