

Styresak 10/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025

Møtedato: 12.02.16

Møtested: Sandnessjøen


Innledning:

Helse Nord HF vedtok i møte den 16. desember 2015 mandat for idéfasen i prosjektet «Helgelandssykehuset 2025». Ut fra dette mandatet har administrasjonen, med bistand fra Sykehusbygg HF, utarbeidet en prosjektplan for hvordan vi ønsker å gjennomføre idéfaseprosessen videre, se vedlegg 1.

Prosjektplanen omfatter en beskrivelse av planlagt gjennomføring av idéfasen med fremdrift, organisering, budsjett med mer.

I figuren under vises en generell planprosess i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.

Idéfasen vil ende opp med beslutning B2 som markert i figuren under. I B2 identifiseres og godkjennes de alternative løsningene som er "liv laga" og som skal videreføres i konseptfasen. Alternativene kan omfatte løsninger både for virksomheten og byggene, og idéfasen skal sikre at alle mulige alternativer, både virksomhetsmessig og bygningsmessige, blir vurdert. I idéfasen beslattes oppstart og godkjenning av mandat for konseptfasen.

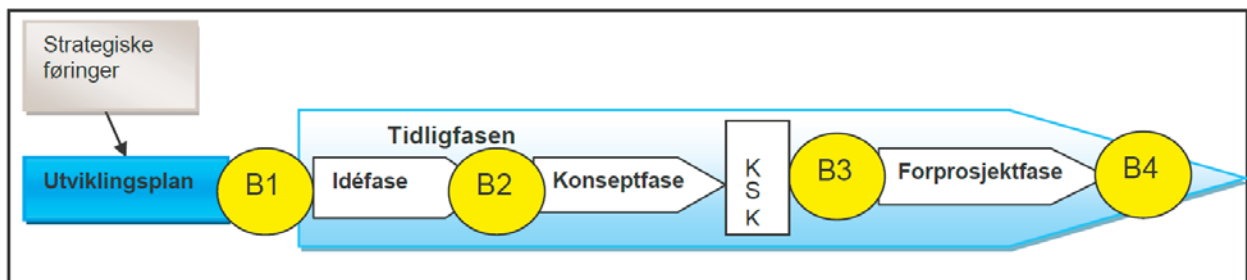

Sykehusbygg HF er innleid til prosjektledelse av tidligfasen.

Bakgrunn for saken:

I løpet av prosessen med utviklingsplanen har det vært følgende behandlinger i styret:

- Styresak 40/2013 – møte 28.05.2013 «Utredning av framtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset HF»
- Styresak 52/2013 – møte 18.06.2013 «Utredning av framtidig somatisk sykehusstruktur for Helgelandssykehuset HF – oppfølgingssak».
- Styresak 26/2015 – møte 30.04.2015 «Utviklingsplan 2025»

I tillegg er styret orientert i følgende møter i forhold til fremdriften i prosjektet:

- Muntlig orientering ved AD i sak 63/2013 – Eventuelt, i styremøte 27.08.13
- Muntlig orientering ved AD i sak 86/2013 – Eventuelt, i styremøte 30.10.13
- Tema på styreseminar 12.12.13
- Muntlig orientering ved AD i sak 56/2104 – Eventuelt, i styremøte 18.06.13
- Muntlig orientering ved AD i sak 63/2014 – Eventuelt, i styremøte 29.08.14
- Tema på styreseminar 29.10.2014
- Muntlig orientering ved AD i sak 10/2015 – Eventuelt, i styremøte 19.02.15

Mandat for idefasen:

Styret for Helse Nord RHF vedtok mandat for Idefasen for Helgelandssykehuset 2025 i styremøte 16. desember 2015. Se side 12 i prosjektplanen.

Budsjett:

Det er utarbeidet et tentativt budsjett for Idefasen for Helgelandssykehuset 2025, på 6 millioner i 2016 og 6 millioner i 2017.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret vedtar forslag til prosjektplan med beskrivelse av gjennomføring av idéfasen.
2. Styret ber adm. direktør rapportere utviklingen i prosjektet hvert styremøte.

Per Martin Knutsen
Adm. direktør

Saksbehandler: Leder Senter for drift og eiendom, Bjørn Bech-Hansen

Vedlegg:

1. Prosjektplan Helgelandssykehuset 2025
2. Vedlegg til prosjektplan – Detaljert fremdriftsplan
3. Styresak 136-2015 Helse Nord – Helgelandssykehuset 2025 – idefase, mandat
