

 **HELGELANDSSYKEHUSET**
HELGELAANTEN SKIEMTJEGÅETIE



Nye Helgelandssykehuset

OSO 14.10.2021


Merethe Myrvang, prosjektkoordinator

Kvalitet

Respekt

Trygghet

Framdrift og videre prosess

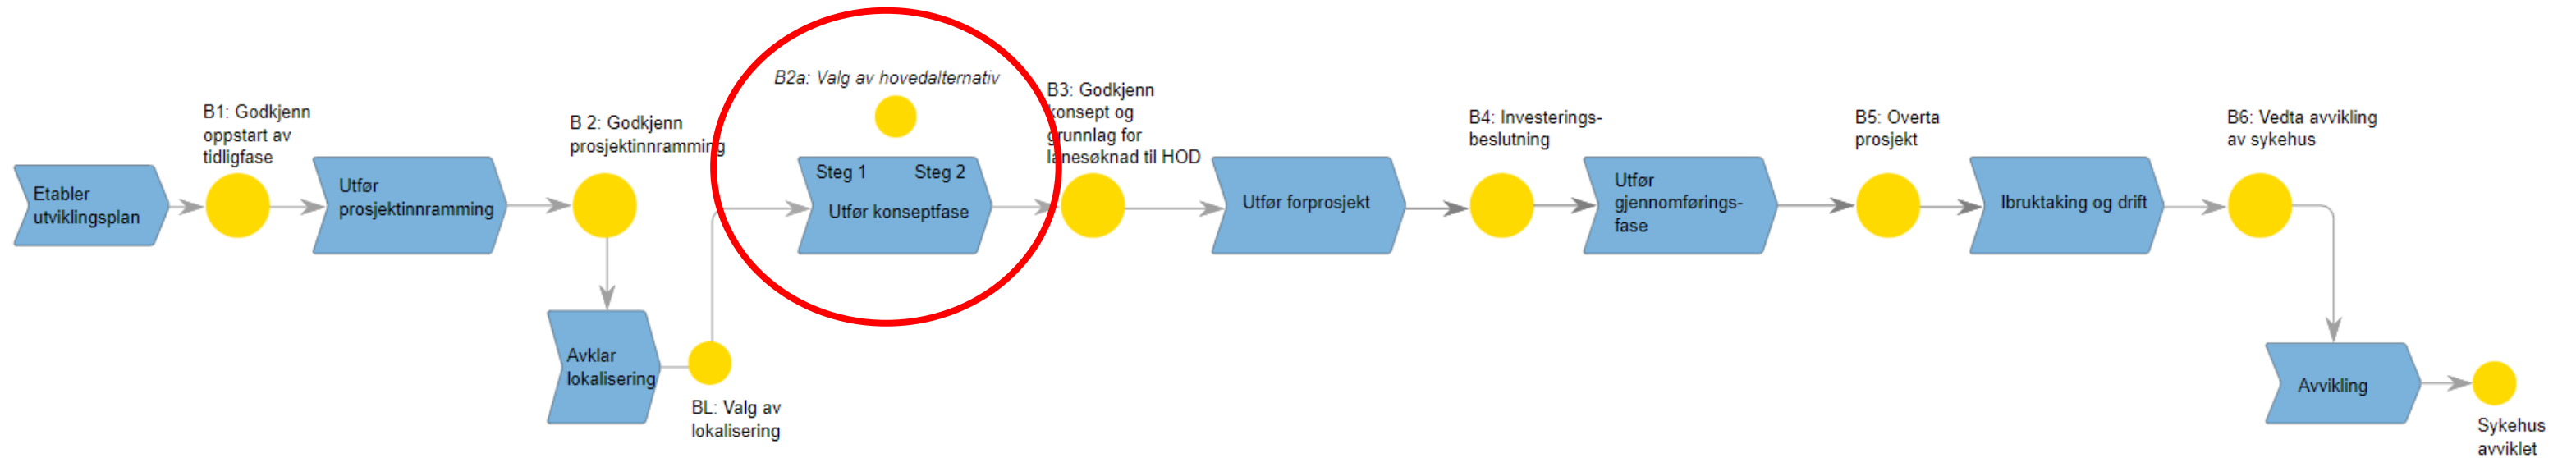

*Eksternt BeslutningsPunkt

Eksterne beslutningspunkter:

- B1: Godkjenn oppstart av tidligfase
- **B2: Godkjenn prosjektinnramming**
- BL: Godkjenn valg av lokalisering
- **B3 a: Godkjenn hovedprogram og valg av hovedalternativ**
- **B3: Godkjenn valg av konsept og grunnlag for lånesøknad til HOD**
- B4: Godkjenn investering
- B5: Overta prosjekt



Styrebehandlinger høsten 2021

- Styrebehandling HN RHF: 29. september:
Begrepsavklaringer, hovedsykehus. FSU og bæreevneanalyse
- Styrebehandling HSYK: 30. september:
Dokumentgjennomgang. Opprettolder vedtak om to tomter i Sandnessjøen
- Styrebehandling HN RHF: 27. oktober:
Dokumentgjennomgang
- Styrebehandling HSYK: 25. november: Styringsdokument steg 1*
- Styrebehandling: HN (15. desember?): Styringsdokument steg 1*

* Vedtatt plan: Styringsdokument steg 1 - behandling august 2021/(september 2021).






Tidligfasen i sykehusbyggprosjekter



Beslutningspunkter

B3A: Anbefalt alternativ for utdypning i steg 2

B3: Valg av konsept






Nye Helgelandssykehuset – en portefølje av delprosjekter

Sandnessjøen og omegn

- Alt 0+
- Alt 1 Nybygg, Rishatten Ombygg/tilbygg
- Alt 2 Ombygg/tilbygg eks
- (Alt 3-Nybygg, tomt a-y)

DMS Sør-Helgeland

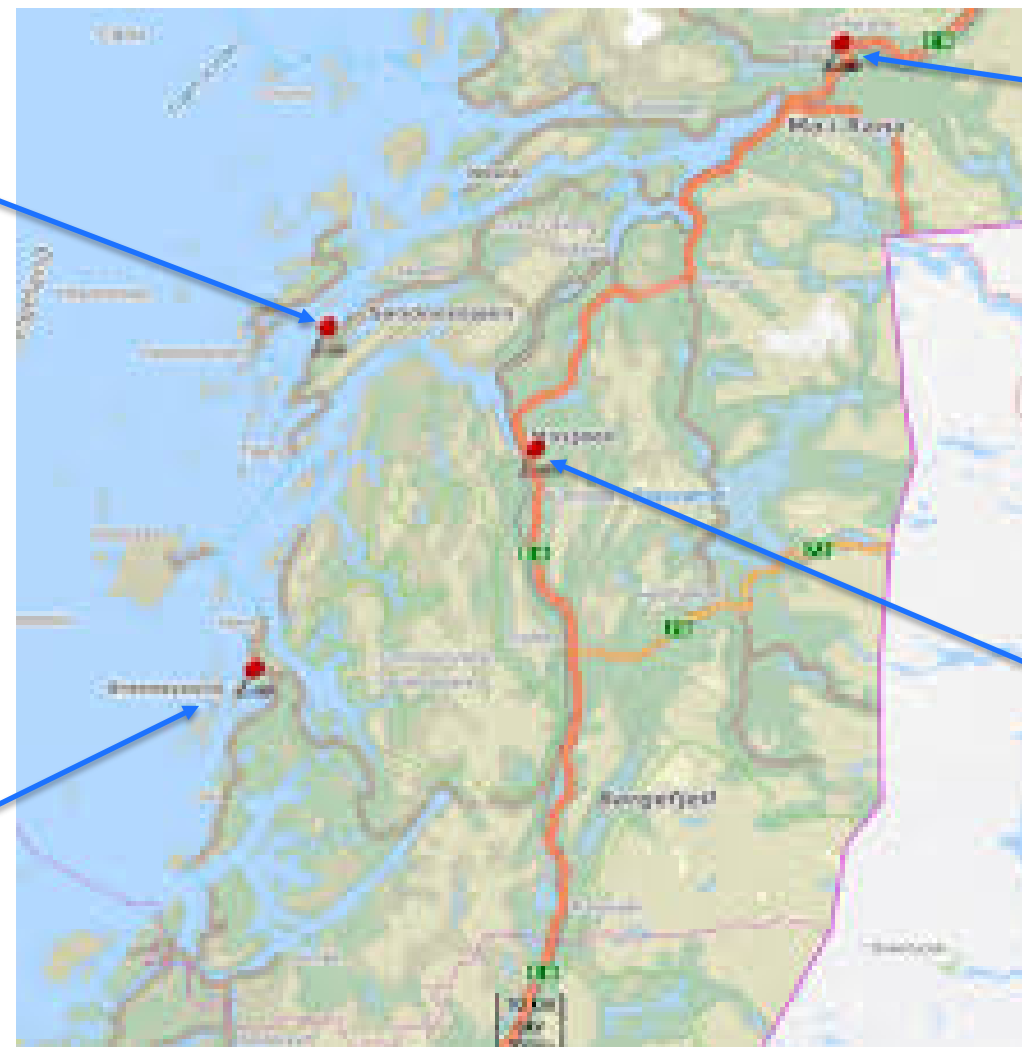


Mo i Rana


- Alt 0+
- Alt 1 ompakking/ombygging inkl. psyk
- Alt 2 ompakking/ombygging inkl. psyk

Mosjøen

- Alt 0+
- Alt 1 ompakking/ombygging inkl. psyk
- Alt 2 ompakking/ombygging inkl. psyk

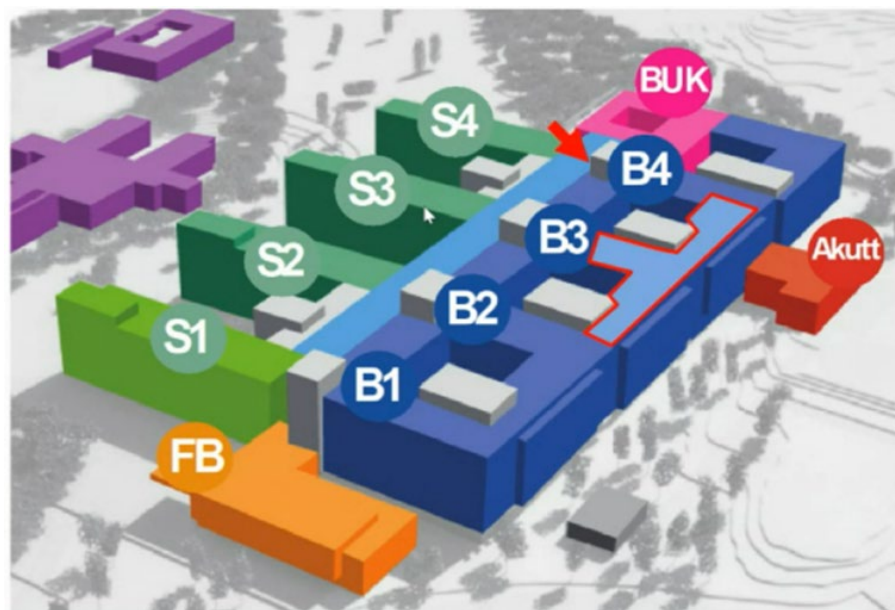

Akershus universitetssykehus 2008

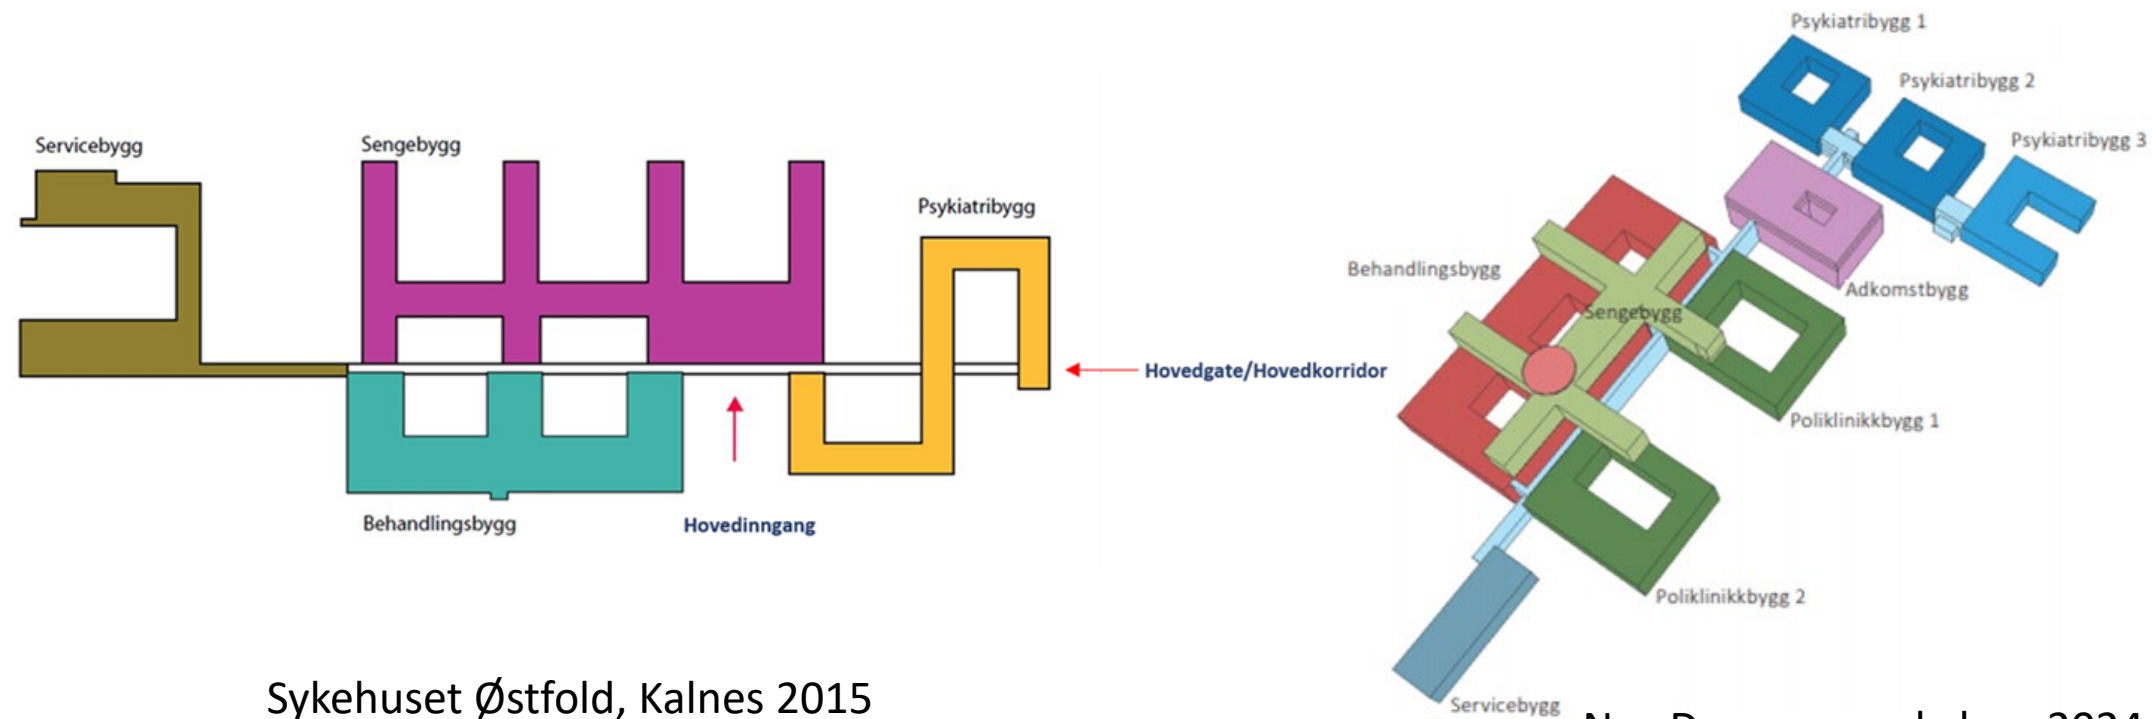


Sykehuset Østfold, Kalnes 2015

Nye Drammen sykehus 2024

Bygningsform



St. Olavs hospital 2006 - 2013

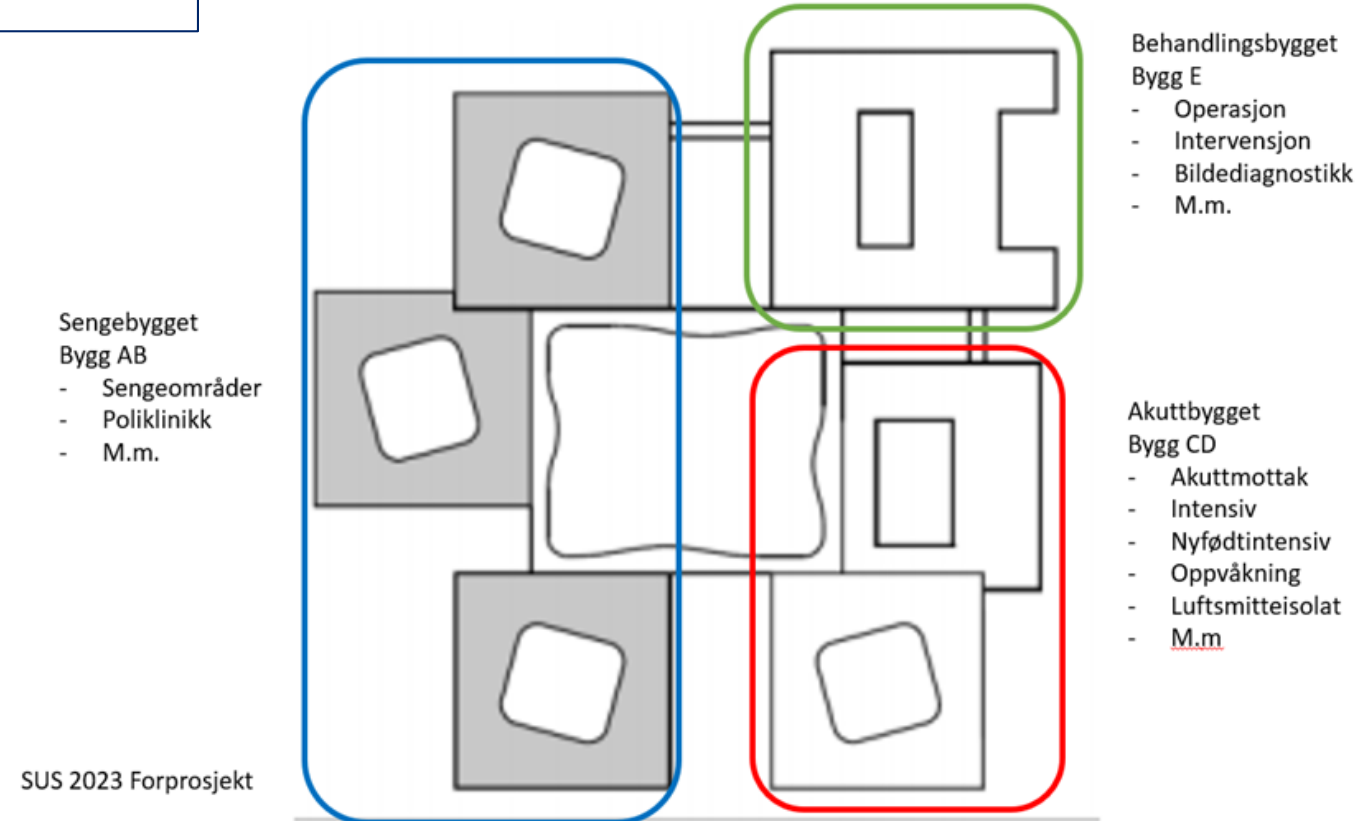

Nye Stavanger universitetssykehus 2024 **SYKEHUSBYGG**

Intern logistikk

